

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»**

17.01.2020

Курск

1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные точки	Показатели	Бюджет	Иные проблемы и риски
■	■	■	■

Индикатор статуса

Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



1.2. Динамика достижения показателей

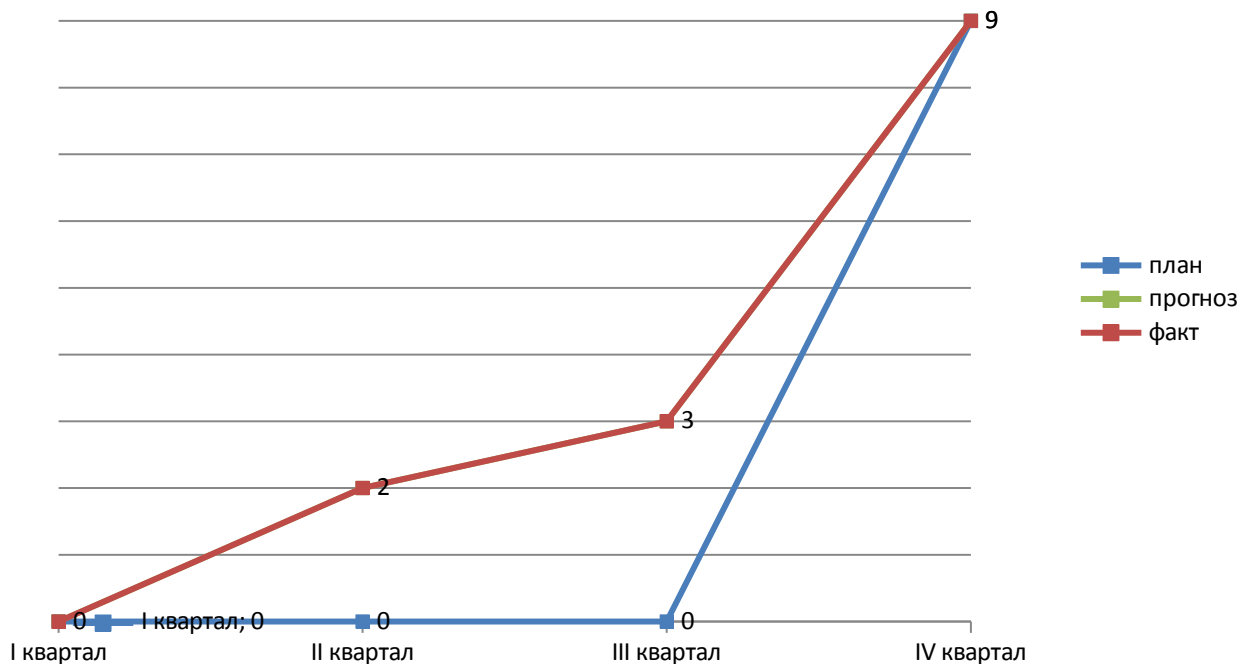

С нарастающим итогом

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№ п/п	Статус	Наименование показателя (единица)	Факт/прогноз по кварталам				Плановое значение	Комментарий
			I	II	III	IV		
1.	■	Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения ¹	28	30	31	36	37	В 2019 году создано 9 ООПТ в соответствии с планом работ. Незначительное отклонение показателя с нарастающим итогом возникло в связи с ликвидацией 1 ООПТ.

Индикатор статуса:

Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений





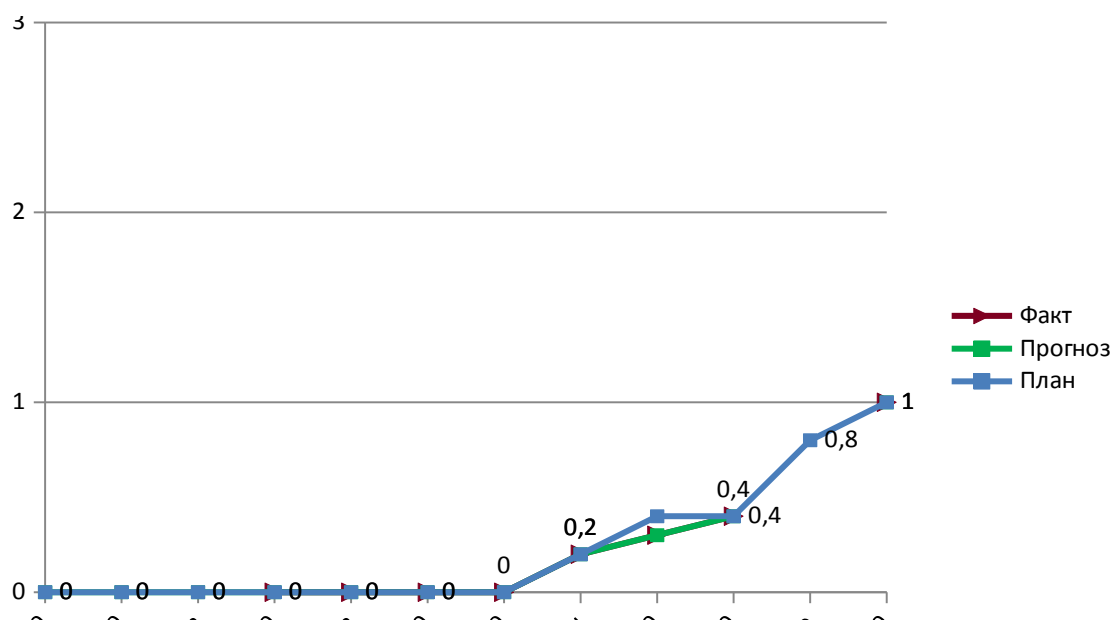

1.4. Динамика исполнения контрольных точек




1

Значение показателя представлено с нарастающим итогом





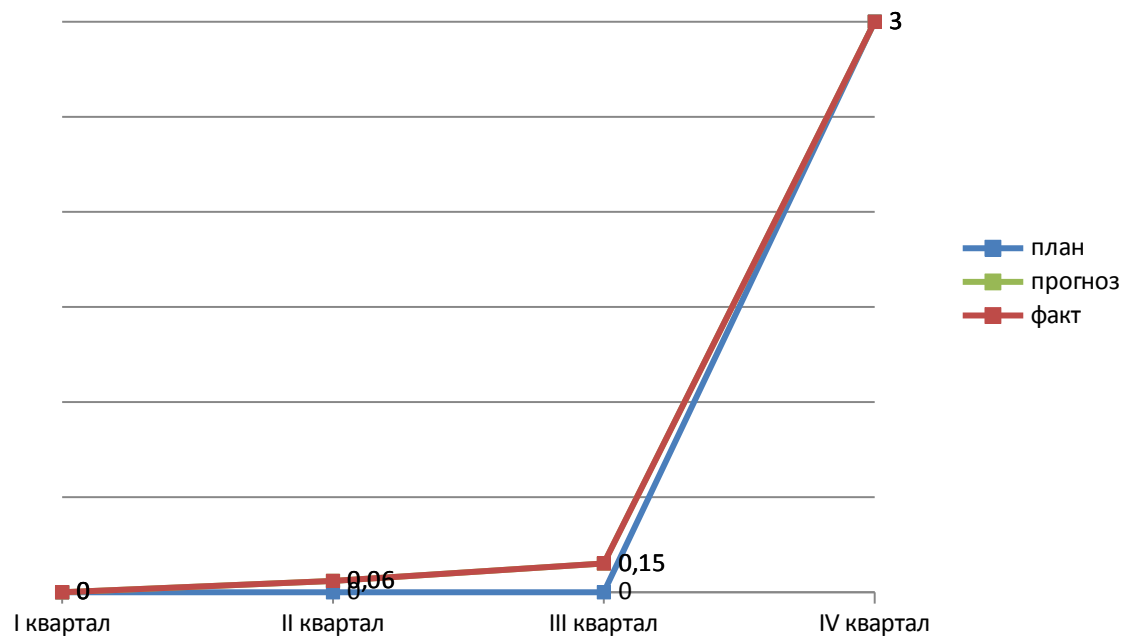

1.5. Статус исполнения контрольных точек

№ п/п	Направление	Статус	Прогноз
1	Организационные мероприятия по проекту	 2	 2
2	Функциональное направление	 6	 6

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)



1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

		Год (поквартально)					Всего по проекту (программе)
		I	II	III	IV	Итого	
Бюджет проекта (план), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,00	0,00	2,286009	2,286009	2,286009
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	2,286009	2,286009	2,286009
Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,06	0,0912	1,819890	1,971090	1,971090
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,06	0,0912	1,819890	1,971090	1,971090
Отклонение		0,00	-0,06	-0,0912	0,466119	0,314919	0,314919
Статус							

Индикатор статуса
Отсутствие отклонений



Наличие отклонений









Наличие критических отклонений



1. 2. Сведения об исполнении контрольных точек

2.

Общие организационные мероприятия							
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	Факт/ прогноз	
1	С		2.1. Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.08.2019	01.07.2019	Выполнено. Отчет о ходе реализации проекта от 01.07.2019
2	С		2.2. Актуализирован паспорт проекта и сводный план	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.07.2019	21.01.2019	Выполнено. Запрос № 3 на изменение паспорта и сводного плана проекта утвержден на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 21.01.2019 Запрос № 4 на изменение паспорта и сводного плана проекта утвержден на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 25.12.2019
3	РПО		4.1. Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	01.08.2019	01.11.2019	Выполнено. Изменение сроков проведения работ связано с задержкой сдачи работ подрядчиком
4	РПО		4.2. Подготовка карт (планов) зон с особыми условиями использования	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	01.09.2019	01.11.2019	Выполнено. Изменение сроков проведения работ связано с задержкой сдачи работ подрядчиком

			территорий Курской области				
5	РПО		4.3 Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	01.12.2019	31.12.2019	Выполнено. Изменение сроков проведения работ связано с длительным согласованием Минприроды России
6	РПО		4.4 Изданы нормативные правовые акты о придании статуса особо охраняемой природной территории	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	31.12.2019	31.12.2019	Выполнено.

3.

Индикатор статуса

Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Бюджет проекта (программы), млн. рублей										Комментарий
					План					Факт/прогноз					
					Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	
1		Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования	О.Ю. Нуждов	31.12.2019	0,00	2,286009	0,00	0,00	2,286009	0,00	1,971090/2,286009	0,00	0,00	1,971090/2,286009	Уменьшение средств в факте связано с экономией в результате проведения аукциона

Индикатор статуса
Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



4.Наличие иных проблем и рисков

№ п/п	Статус	Проблема/риск	Предлагаемые решения	Ответственный исполнитель
1.			Отсутствуют	

Индикатор статуса
Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие
критических отклонений

