

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА  
«Дикая природа России: сохранить и увидеть»**

25.09.2019

Курск

## 1. Статус реализации

### 1.1. Общий статус реализации

Контрольные точки	Показатели	Бюджет	Иные проблемы и риски
■	■	■	■


Индикатор статуса

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

### 1.2. Динамика достижения показателей

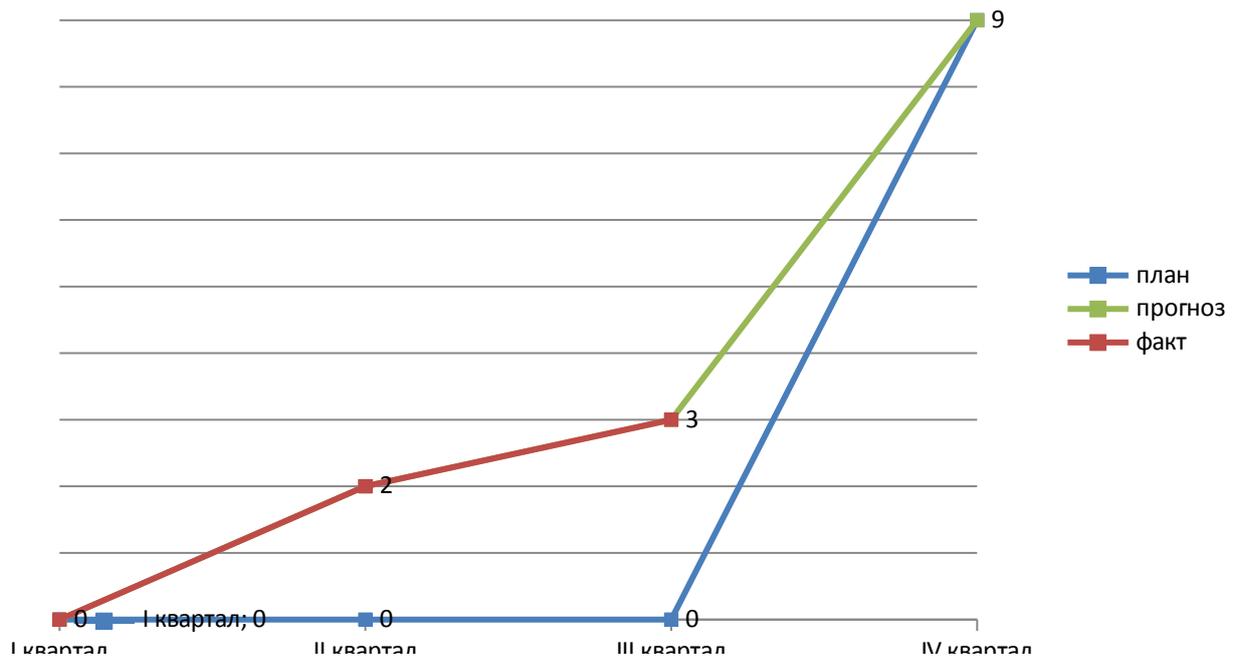

С нарастающим итогом

## 1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№ п/п	Статус	Наименование показателя (единица)	Факт/прогноз по кварталам				Плановое значение на 2019	Комментарий
			I	II	III	IV		
1.	■	Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения <sup>1</sup>	28	30	31	37	37	Значение показателей будет достигнуто к концу 2019 года


Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

## 1.4. Динамика исполнения контрольных точек

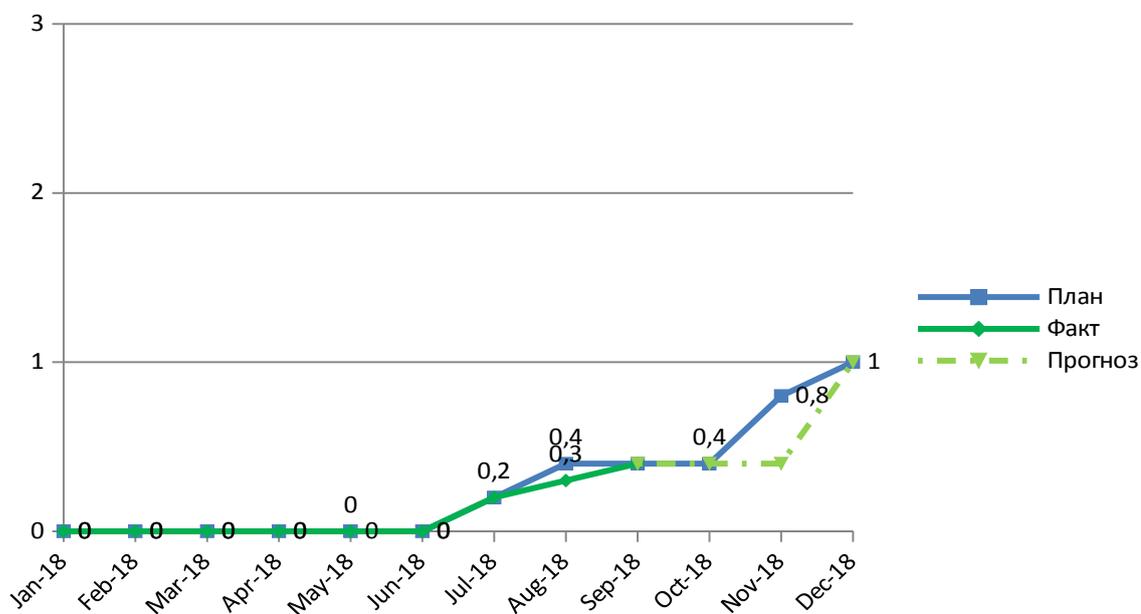


1

Значение показателя представлено с нарастающим итогом

## 1.5. Статус исполнения контрольных точек

№ п/п	Направление	Статус	Прогноз
1	Организационные мероприятия по проекту	 1	 2
2	Функциональное направление	 2	 1 5

## 1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

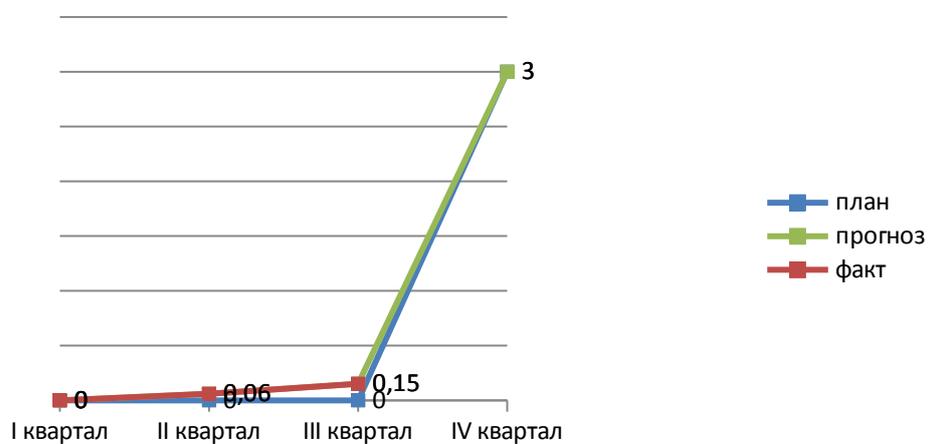

## 1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

		Год (поквартально)					Всего по проекту (программе)
		I	II	III	IV	Итого	
Бюджет проекта (план), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,00	0,00	3,000675	3,000675	3,000675
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	3,000675	3,000675	3,000675
Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Курской области	0,00	0,06	0,0912	0/2,134809	0,1512/2,286009	0,1512/2,286009
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,06	0,0912	0/2,134809	0,1512/2,286009	0,1512/2,286009
Отклонение		0,00	-0,06	-0,0912	3,000675/1,020287	2,549475/0,266362	2,549475/0,266362
Статус							

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений

## 2. Сведения об исполнении контрольных точек

Общие организационные мероприятия							
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	Факт/ прогноз	
1	С		2.1. Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.08.2019	01.07.2019	Выполнено. Отчет о ходе реализации проекта от 01.07.2019
2	С		2.2. Актуализирован паспорт проекта и сводный план	Курскоблприроднадзор (директор департамента К.О. Поляков)	01.07.2019	21.01.2019	Выполнено. Запрос № 3 на изменение паспорта и сводного плана проекта утвержден на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 21.01.2019
3	РПО		3.1. Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	01.08.2018	13.09.2018	Выполнено частично. Завершение работ планируется в 4 квартале 2019 года.
4	РПО		3.2. Подготовка карт (планов) зон с особыми условиями использования территорий Курской области	ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ»)	01.08.2018	-	Выполнено частично. Завершение работ планируется в 4 квартале 2019 года.

Индикатор статуса

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

## 3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Бюджет проекта (программы), млн. рублей										Комментарий
					План					Факт/прогноз					
					Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Курской области	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	
1		Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования	О.Ю. Нуждов	31.12.2019	0,00	3,000675	0,00	0,00	3,000675	0,00	0,151200/ 2,286009	0,00	0,00	0,15120/ 2,286009	Освоение оставшихся средств планируется в 4 квартале 2019 года. Уменьшение средств в прогнозе связано с экономией в результате проведения аукциона Часть средств перераспределена на иные цели главному распорядителю.

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений

## 4.Наличие иных проблем и рисков

№ п/п	Статус	Проблема/риск	Предлагаемые решения	Ответственный исполнитель
1.			Отсутствуют	

Индикатор статуса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений
